


Rendición de Cuentas Junio 2020- Directriz N. 085-MIDEPLAN-MEIC

“Sobre las medidas para acelerar la simplificación de trámites, requisitos o procedimientos que impactan de manera favorable a la persona ciudadana y al sector productivo”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 117 del 21/05/2020



Seguimiento Implementación: Directriz 085 Declaración Jurada

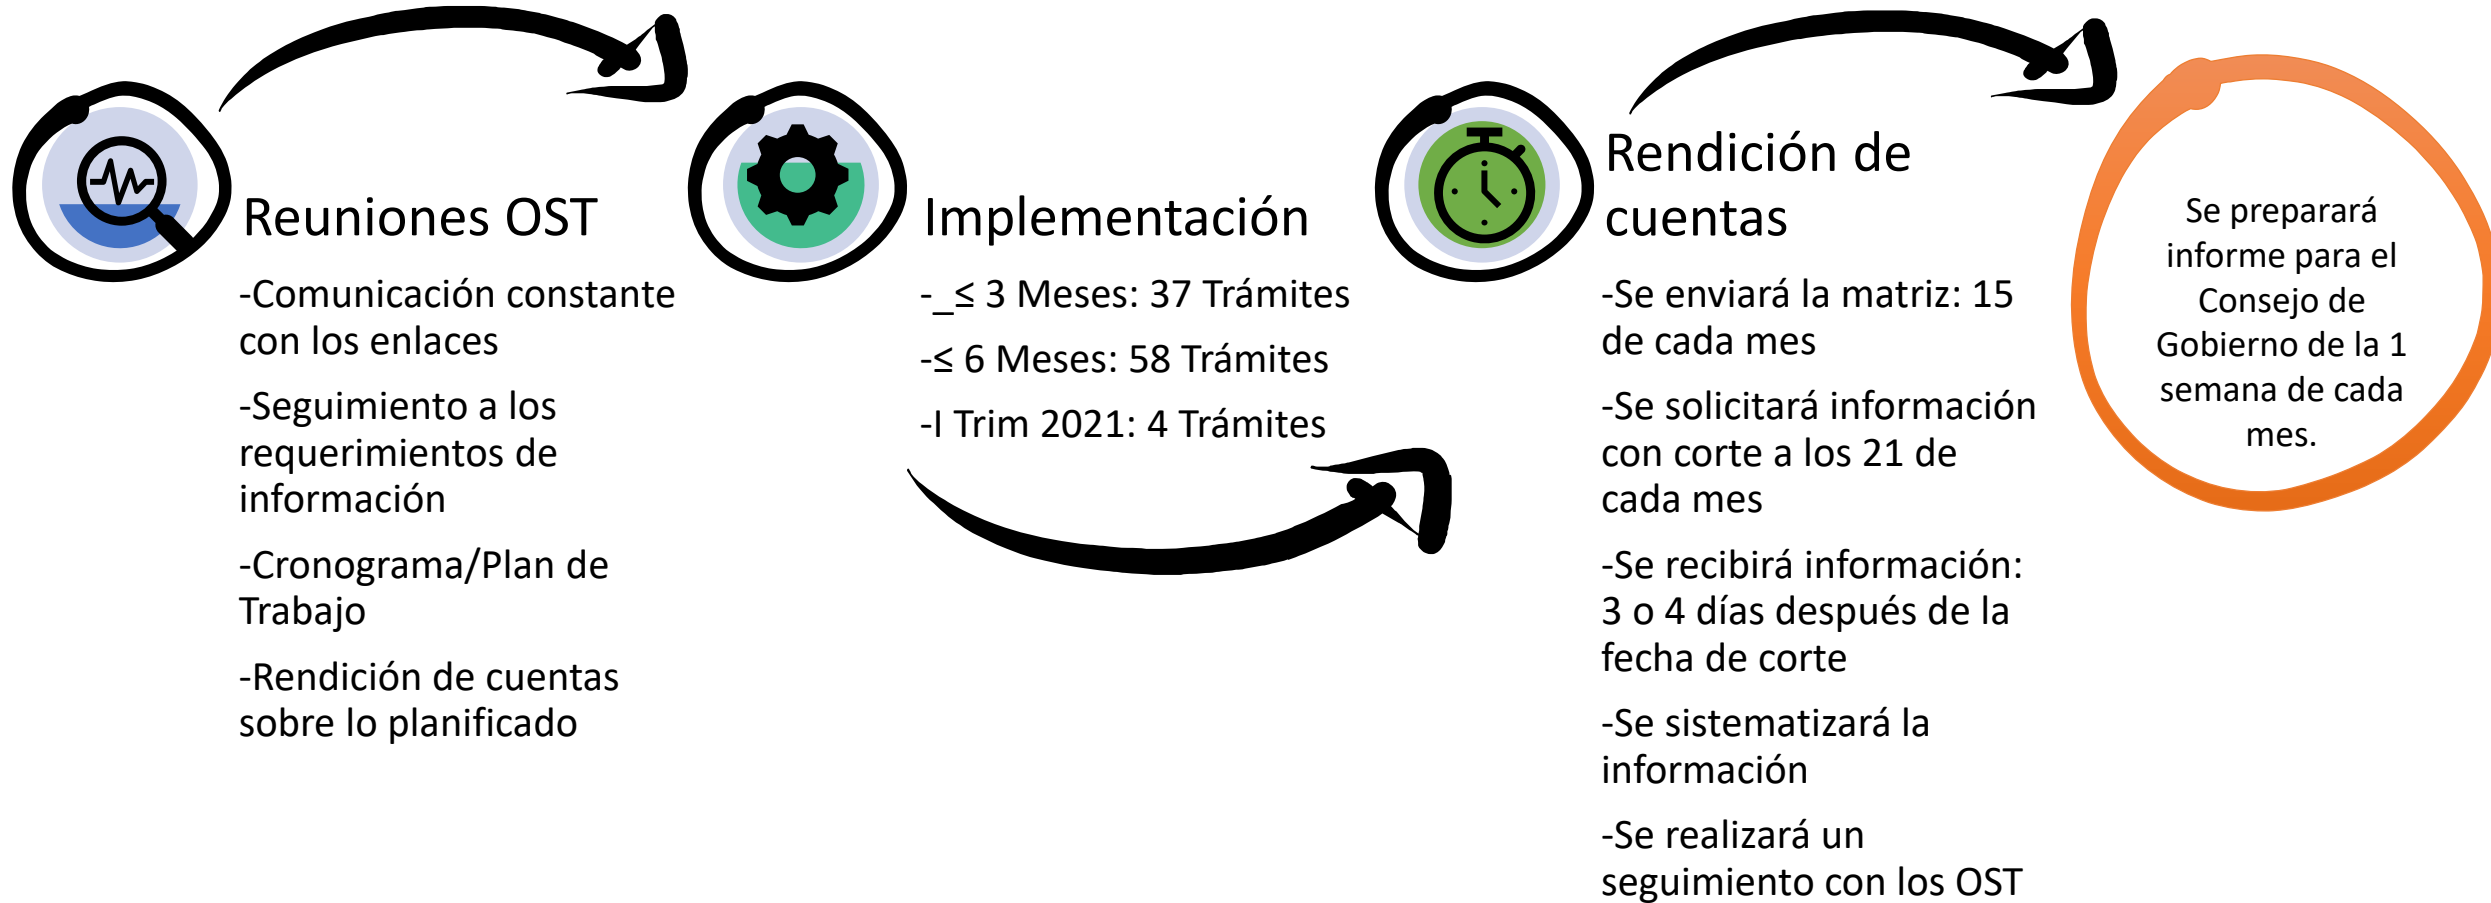

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO N° 2

Sobre la Declaración Jurada

60

Trámites reportados
"Tiempo de Implementación"

23

Trámites reportados en
estado "Atrasado"

13

Trámites reportados como
"Finalizados"
(MAG, ICE, INVU, INDER)

100%

Se recibió
información de
todas las
instituciones con
trámites pendientes
de implementación

13

instituciones



83

Pendientes de Implementar

Se realizaron ajustes a la matriz

Se suman 13

- 10 trámites del INDER
- 1 de M. de Cartago
- 2 del INVU

Se restan 16

- 6 trámites del CONAVI*
- 6 trámites del INTA*
- 3 trámites del ICE*
- 1 Registro Nacional*

Trámites
implementados a la
fecha

42

≤ 3 Meses: 37

≤ 6 Meses: 39

I Trim 2021: 7

TOTAL DE TRAMITES:

125

Trámites Finalizados desde la Emisión de la Directriz

Institución	Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
MAG	1. Sistema de registro del ministerio de agricultura y ganadería, para certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario (pympa) *pmr	Finalizado	100%	≤ 6Meses
	2. Permiso de quemas agrícolas controladas	Finalizado	100%	≤ 6Meses
ICE	3. Contratación Administrativa (Carteles)	Finalizado	100%	≤ 6 Meses
	4. Servicio definitivo de suministro de energía eléctrica para clientes nuevos con red disponible	Finalizado	100%	≤ 6 Meses
	5. Servicios Provisionales de suministro de energía eléctrica para clientes con red disponible	Finalizado	100%	≤ 6 Meses
	6. Traslado de medidor externo	Finalizado	100%	≤ 6 Meses
	7. Traspaso de Servicio Eléctrico (Cambio de Nombre)	Finalizado	100%	≤ 6 Meses

Trámites Finalizados desde la Emisión de la Directriz

Institución	Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
INVU	8. Titulación por venta de inmuebles	Finalizado	100%	≤ 3 Meses
INDER	9. Conformación de las estructuras de Gobernanza	Finalizado	100%	*Implementados posterior a la Directriz
	10. Apoyo a la gestión de las estructuras de gobernanza	Finalizado	100%	* Implementado posterior a la Directriz
	11. Gestion del Conocimiento	Finalizado	100%	* Implementado posterior a la Directriz
	12. Servicio de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria	Finalizado	100%	≤ 3 Meses
	13. Sevicio de obras de infraestructura rural	Finalizado	100%	≤ 3 Meses

Responsables de las 13 Instituciones con trámites pendientes de implementar

Institución	Oficial de Simplificación de Trámites	Responsable Asignado
MAG	Ana Cristina Quirós Soto / Viceministra / aquiross@mag.go.cr ; ost@mag.go.cr	DNEA: Licda. Alba Montenegro Montenegro/Correo: amontenegro@mag.go.cr ; INTA: Ing. Renato Jiménez Zúñiga/Correo: rjimenez@inta.go.cr ; OFINASE: Ing. Tania López Lee/Correo: tlopez@ofinase.go.cr ; SFE: Lic. Alexis Carranza Jiménez/Correo: acarranza@sfe.go.cr , Pablo Andrey Marengo Guevara < pmarengo@sfe.go.cr >
M.Salud	Pedro González Morera / Viceministro de Salud / pedro.gonzalez@misalud.go.cr	Ing. Nidia Morera González/Correo: nidia.morera@misalud.go.cr
CCSS	Ronald Lacayo Monge / Gerente Administrativo / rlacayo@ccss.sa.cr	Lic. Luis Diego Calderón Villalobos/Correo: ldcalderon@ccss.sa.cr ; acarmonac@ccss.sa.cr
MOPT	Eduardo Brenes Mata / Viceministro de Transporte y Seguridad Vial / eduardo.brenes@mopt.go.cr	Lic. Christian Mèndez Blando/correo: cmendezb@mopt.go.cr
AyA	Annette Henchoz Castro / SubGerente / ahenchoz@aya.go.cr /	Lic. Andrey Vila Abarca/Correo: andreyvila@aya.go.cr
ICE	Hazel Cepeda Hodgson / Gerente General / HCepeda@ice.go.cr	Carlos Rojas Castro/Correo: CRojas@ice.go.cr
TEC		Sonia M. Astúa Fernández/Correo: sastua@itcr.ac.cr
IFAM	Cristian Alpízar Alfaro / Director Ejecutivo / calpizar@ifam.go.cr /	Marlon Ávalos Elizondo/Correo: mavalos@ifam.go.cr
M. Desamparados	Gilberth Jiménez Siles / Alcalde / gjimenez@desamparados.go.cr	Sra. Fannie Alvarado Dávila/correo: falvarado@desamparados.go.cr
M. Cartago	Mario Redondo Poveda / Alcalde / alcalde@muni-carta.go.cr / 2550-4400	Sra. Paulina Ramírez Portuguez/Correo: paulinarp@muni-carta.go.cr
INDER	Jorge Mauricio Pacheco Mendoza / Gerente General a.i. / gerencia.general@inder.go.cr ; jpacheco@inder.go.cr	Juan Carlos Jurado/Correo: jjurado@inder.go.cr / Jorge Pacheco Mendoza
INVU	Fabián Mora Chaverri / Sub Gerente General / fmora@invu.go.cr	Fabián Mora Chaverri/Correo: fmora@invu.go.cr
M.Justicia y Paz	Diana Posado Rosado / dposada@mj.go.cr ; Viceministra	Sra. Adelita Abarca Ortega/Correo: aabarca@rnp.go.cr

Detalle cumplimiento de la Declaración Jurada

Información remitida por las Instituciones Junio 2020



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Declaración Jurada a la autorización que brinda el Ente correspondiente en territorios del país con características especiales, bajo la modalidad de territorios administrados por el Estado o sus instituciones con régimen jurídico especial, zona marítimo terrestre, zonas fronterizas, territorios indígenas, polos de desarrollo turístico.	En tiempo	50%	≤ 3 Meses
2. Declaración jurada en el requisito de permiso de construcción que emite el Ente correspondiente (Municipalidades).	En tiempo	50%	≤ 3 Meses

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Registro de Personas Físicas o Jurídicas	En tiempo	16%	≤ 3 Meses
2. Registro Ingrediente Activo Grado Técnico (IAGT)	En tiempo	50%	≤ 3 Meses
3. Registro Plaguicidas Botánicos	En tiempo	40%	≤ 3 Meses
4. Registro Equipos de Aplicación	En tiempo	16%	≤ 3 Meses
5. Registro Plaguicida Sintético Formulado	En tiempo	50%	≤ 3 Meses
6. Registro Coadyuvantes y Sustancias Afines a plaguicidas	En tiempo	50%	≤ 6Meses
7. Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico por Equivalencia	En tiempo	50%	≤ 6Meses
8. Registro de Enmiendas de uso Agrícola	En tiempo	25%	≤ 6Meses
9. Modificaciones al Registro Plaguicidas, Coadyuvantes, Sustancias Afines	En tiempo	50%	≤ 6Meses
10. Modificaciones al Registro Fertilizantes, enmiendas y sustancias afines	En tiempo	25%	≤ Más de 6 Meses

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
11. Modificaciones al Registro Equipos de Aplicación de Agro insumos	En tiempo	16%	Mas de 6 Meses
12. Importación de muestras de Equipos de aplicación de insumos	En tiempo	50%	Más de 6 meses
13. Registro de Fertilizantes de uso agrícola	En tiempo	25%	Más de 6 meses
14. Sistema de registro del ministerio de agricultura y ganadería, para certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario (pympa) *pmr	Finalizado	100%	≤ 6Meses
15. Registro de importadores de productos de origen vegetal	En tiempo	15%	≤ 6Meses
16. Permiso de quemas agrícolas controladas	Finalizado	100%	≤ 6Meses
17. Aprobación de certificados de uso conforme del suelo, para inscripción de bienes inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, por la Ley de Informaciones Posesorias.	Eliminado según justificación mediante Oficio DAF-141-2020		
18. Aprobación de certificados de uso conforme de suelo para titulación de tierras en vía administrativa por el INDER (artículo 58 y 59 del Decreto Ejecutivo N° 29375-MAG-MINAE-S-HMOPT)	Eliminado según justificación mediante Oficio DAF-141-2020		

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
19. Certificado de uso conforme de suelo, para los incentivos fiscales	Eliminado según justificación mediante Oficio DAF-141-2020		
20. Autorización de cambio de uso del suelo agrícola a partir de Estudios Detallados de suelos y capacidad de uso de las Tierras	Eliminado según justificación mediante Oficio DAF-141-2020		
21. Autorización de cambio de uso del suelo agrícola a urbano	Eliminado según justificación mediante Oficio DAF-141-2020		
22. Autorización de Estudios semidetallados y detallados de suelo y capacidad de uso de las tierras	Eliminado según justificación mediante Oficio DAF-141-2020		

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Solicitud de patente de invención (Sistema Nacional o PCT) que realicen: <ul style="list-style-type: none"> • Inventores personas físicas. • Micro o pequeñas empresas. • Instituciones de educación superior públicas. • Institutos de investigación científica y tecnológica del sector público. 	En tiempo	25%	≤ 3 Meses
2. Salida del país de vehículos automotores	En tiempo	(No se reporta proceso la elaboración del cronograma.)	≤ 6 Meses
3. Reposición de títulos de propiedad de bienes muebles.	En tiempo	(No se reporta proceso la elaboración del cronograma.)	≤ 6 Meses
4. Depósito de placas metálicas y dispositivo de identificación.	Se fusiona	(No se reporta proceso la elaboración del cronograma.)	≤ 6 Meses
5. Reposición del dispositivo de identificación por extravío.	En tiempo	(No se reporta proceso la elaboración del cronograma.)	≤ 6 Meses
6. Reposición de placas metálicas por robo del bien mueble.	En tiempo	(No se reporta proceso la elaboración del cronograma.)	≤ 6 Meses
7. Reposición de placas metálicas por extravío	En tiempo	(No se reporta proceso la elaboración del cronograma.)	≤ 6 Meses

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1, Permisos de uso de inmuebles en precario	En tiempo	20%	≤ 6 Meses
2. Contratación Administrativa (Carteles)	Finalizado	100%	≤ 6 Meses
3. Servicio definitivo de suministro de energía eléctrica para clientes nuevos con red disponible	Finalizado	100%	≤ 6 Meses
4. Servicios Provisionales de suministro de energía eléctrica para clientes con red disponible	Finalizado	100%	≤ 6 Meses
5. Traslado de medidor externo	Finalizado	100%	≤ 6 Meses
6. Traspaso de Servicio Eléctrico (Cambio de Nombre)	Finalizado	100%	≤ 6 Meses

** Se indica mediante correo electrónico el Sr. Carlos Rojas del 24 de junio, que en documento inicial detectaron tres trámites duplicados por lo tanto fueron eliminados.

Ministerio de Salud (MS)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Autorización para instalaciones que albergan emisores de radiaciones ionizantes con nivel de seguridad bajo (Tipo IV)	En tiempo	50%	Más de 6 meses
2. Revisión de planos de proyectos menores a 300 m2. Excluye casas de habitación.	Atrasado	80%	Más de 6 meses
3. Renovación del registro de productos alimenticios, fórmulas infantiles y suplementos a la dieta	Atrasado	80%	≤ 3 Meses
4. Otorgamiento de Habilitación a centros de acondicionamiento físico y centros de tatuajes y perforaciones corporales (Primera vez o Renovación) Tipo de Riesgo B	Atrasado	80%	≤ 3 Meses
5. Declaración anual de operación de calderas	Atrasado	80%	Más de 6 meses

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Certificación de deudas vigente del sujeto de financiamiento con otras entidades financieras	En tiempo	80%	≤ 6 Meses
2. Declaración jurada de que el Gobierno Local se encuentra al día en la actualización de tarifas.	En tiempo	80%	≤ 6 Meses

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Inscripción de un Agente Naviero en el Registro Marítimo Administrativo	En tiempo	10%	≤ 3 Meses
2. Inscripción de Empresa de Transporte por Aguas Interiores en el Registro Marítimo Administrativo	En tiempo	10%	≤ 3 Meses
3. Inscripción de Empresa Naviera Extranjera	En tiempo	10%	≤ 3 Meses
4. Inscripción de Empresa Naviera Nacional	En tiempo	10%	≤ 3 Meses
5. Aportes de materiales como colaboración para la realización de obras comunales	En tiempo	5%	≤ 6 Meses
6. Permiso para Excepción de Restricción Vehicular	En tiempo	5%	≤ 6 Meses
7. Certificación personería jurídica y naturaleza de las acciones actualizadas	En tiempo	5%	≤ 6 Meses
8. Póliza de riesgo del trabajo vigente	En tiempo	5%	≤ 6 Meses
9. Cursos de educación vial	En tiempo	5%	≤ 6 Meses
10. Convalidación de licencia de conductor con base en una licencia del extranjero	En tiempo	5%	≤ 6 Meses

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
11. Emisión de orden de entrega de placas detenidas	En tiempo	20%	≤ 3 Meses
12. Emisión de orden de entrega de vehículos detenidos	En tiempo	20%	≤ 3 Meses
13. Emisión de orden de entrega de bicicletas, patinetas, patines u otros artefactos detenidos	En tiempo	20%	≤ 3 Meses
14. Solicitud de autorización o renovación de permiso de transporte de turismo	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
15. Solicitud de tarjetas de Capacidad y tarifa	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
16. Solicitud de renovación y ampliación de los permisos especiales de circulación AGV (Agente Vendedor)	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
17. Solicitud de autorización del permiso para uso de equipo de perifoneo, otorgamiento, renovación y duplicado.	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
18. Solicitud de autorización del permiso para uso de señales rotativas luminosas hasta por seis meses, otorgamiento, duplicado y renovación	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
19. Solicitud de formalización de contratos de concesión y/o renovación de concesión de transporte remunerado de personas	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
20. Solicitud de autorización para el traspaso de los derechos de concesión y/o permisos de transporte público modalidad autobús	Atrasado	20%	≤ 6 Meses

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
21. Solicitud de asignación de código de bus	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
22. Solicitud de fusión de rutas de transporte público modalidad autobús	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
23. Solicitud para la autorización de traspasos de concesión del servicio público modalidad taxi	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
24. Solicitud de formalización de la concesión administrativa de taxi (suscripción del contrato)	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
25. Solicitud de renovación de permiso de carga limitada	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
26. Requisitos para permiso de grúa de arrastre por primera vez	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
27. Solicitud para permiso especial carga con exceso de dimensiones	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
28. Solicitud para permiso especial carga con exceso de dimensiones – extranjeros	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
29. Solicitud de permiso de carga indivisible (PMA)	Atrasado	20%	≤ 6 Meses
30. Presentación de Recursos Administrativos	Atrasado	20%	≤ 6 Meses

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
31. Permiso de pesos y dimensiones en materia peligrosa	Eliminado	20%	
32. Cambio de características de vehículo	Eliminado	20%	
33. Permisos de pesos y dimensiones convencional	Eliminado	20%	
Poder de representación de la empresa si se requiere	Eliminado	20%	
Aprobación de diseño de la estructura de pavimentos a construir por tercero en rutas nacionales	Eliminado	20%	
Aprobación de diseño de la estructura de pavimentos para accesos de propiedades privadas de rutas nacionales sin acceso restringido.	Eliminado	20%	

****** No se reporta avance sobre los 6 trámites del CONAVI, según justificación remitida por el Sr. Mario Rodríguez Vargas/CONAVI al Sr. Eduardo Brenes, el pasado 11 de mayo 2020

Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Formularios de solicitud créditos INVU en plataforma. Actualmente un interesado tiene que llenar cerca de 5 formularios con datos personales y con implementación de Declaración Jurada la persona puede en un solo documento y declaración jurada pasar a fase de análisis	En tiempo	80%	≤ 3 Meses
2. Titulación por venta de inmuebles	Finalizado	100%	≤ 3 Meses
3. Solicitud de préstamo	Atrasado	10%	≤ 3 Meses

Municipalidad de Cartago

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Licencia de Funcionamiento de licores	En tiempo	25%	≤ 3 Meses
2. Cambio de Nombre Comercial	En tiempo	25%	≤ 3 Meses
3. Ampliación de Actividad de la Licencia de Funcionamiento	En tiempo	25%	≤ 3 Meses
4. Traslado de Licencia de Funcionamiento	En tiempo	25%	≤ 3 Meses
5. Traspaso de Licencia funcionamiento municipal	En tiempo	25%	≤ 3 Meses
6. Licencia de Funcionamiento Municipal	En tiempo	25%	≤ 3 meses

Municipalidad de Desamparados

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Solicitud de Inhumación y/o Exhumación	Atrasado	0%	≤ 6 Meses
2. Solicitud de Licencia Comercial	En tiempo	35%	≤ 6 Meses

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Solicitud de anulación de adeudos y/o suspensión o desafiliación de Trabajador Independiente	En tiempo	90%	≤ 6 Meses

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Orientación y gestión de servicios institucionales (El proceso de Orientación y Gestión de Servicios Institucionales contempla la comprobación de requisitos de admisibilidad e idoneidad, y es de este proceso que se deriva los demás servicios o procedimientos institucionales. Tanto la Ley como su reglamento en los artículo N° 49 (personas físicas) y N° 50 (personas jurídicas), contempla las siguientes declaraciones juradas)	En Tiempo	70%	≤ 3 Meses
2. Conformación de las estructuras de Gobernanza	Finalizado	100%	*Implementados posterior a la Directriz
3. Apoyo a la gestión de las estructuras de gobernanza	Finalizado	100%	* Implementado posterior a la Directriz
4. Gestion del Conocimiento	Finalizado	100%	* Implementado posterior a la Directriz
5. Gestion de encadenamientos asociativos y productivos	En tiempo	70%	≤ 3 Meses
6. Servicio Crédito Rural	En tiempo	70%	≤ 3 Meses
7. Servicio de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria	Finalizado	100%	≤ 3 Meses
8. Sevicio de obras de infraestructura rural	Finalizado	100%	≤ 3 Meses
9. Gestión De Proyectos de Desarrollo Rural	En tiempo	70%	≤ 3 Meses

Instituto de Desarrollo Rural (INDER)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
10. Pre inversión para proyectos de Desarrollo Rural	En Tiempo	70%	≤ 3 Meses
11. Demostración de Ingresos para lote de vivienda	En tiempo	80%	≤ 3 Meses
Trámites que fueron implementados posterior al Decreto 41795-MEIC-MP pero antes de la Directriz 085-Mideplan-MEIC:		100%	
-Dotación de Tierras a personas físicas		100%	
-Dotación de Tierras a Personas Jurídicas		100%	
-Dotación de lotes para vivienda		100%	
-Compra de inmuebles		100%	

Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Trámites	Estado Actual	Porcentaje de Avance	Tiempo Límite de Implementación
1. Trámites de becas de posgrados	En tiempo	50%	≤ 3 Meses
2. Trámites de becas estudiantiles	En tiempo	50%	≤ 3 Meses
3. Trámites ante el Tribunal Disciplinario Formativo	En tiempo	50%	≤ 3 Meses
4. Trámites ante Financiero Contable	En tiempo	50%	≤ 3 Meses
5. Trámite ante Departamento de Gestión del Talento Humano, Experiencia profesional por ejercicio libre de la profesión	En tiempo	50%	≤ 3 Meses
6. Trámite ante Departamento de Gestión del Talento Humano, Declaración jurada que se aplica para concursos de antecedentes externos	En tiempo	50%	≤ 3 Meses


Detalle cumplimiento Planes de Mejora Regulatoria

Información remitida por las Instituciones
Junio 2020



INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO N° 3

Sobre los PMR al 10 de junio del 2020



24

Instituciones presentaron el II Informe de Avance en tiempo (2 de ellas de manera extemporánea)

8

Instituciones presentaron solamente el I Informe de Avance del PMR 2020

5

Instituciones mostraron 0% de Avance en el PMR 2020 al 10 de junio del 2020


37

Instituciones


113

Trámites

Instituciones con PMR 2020 Definitivo (Administración Central, Descentralizada y Municipalidades)




11 de 37 instituciones **cumplieron con el 50% de avance**: CCSS, ICE, IMAS, COMEX, Presidencia, MTSS, PIMA y PROCOMER



13 instituciones **no cumplieron** con el 50% establecido en la Directriz. Porcentajes de avance van del 19% al 44%


Instituciones con PMR 2020

37 PRESENTARON EL PLAN DE MEJORA REGULATORIA

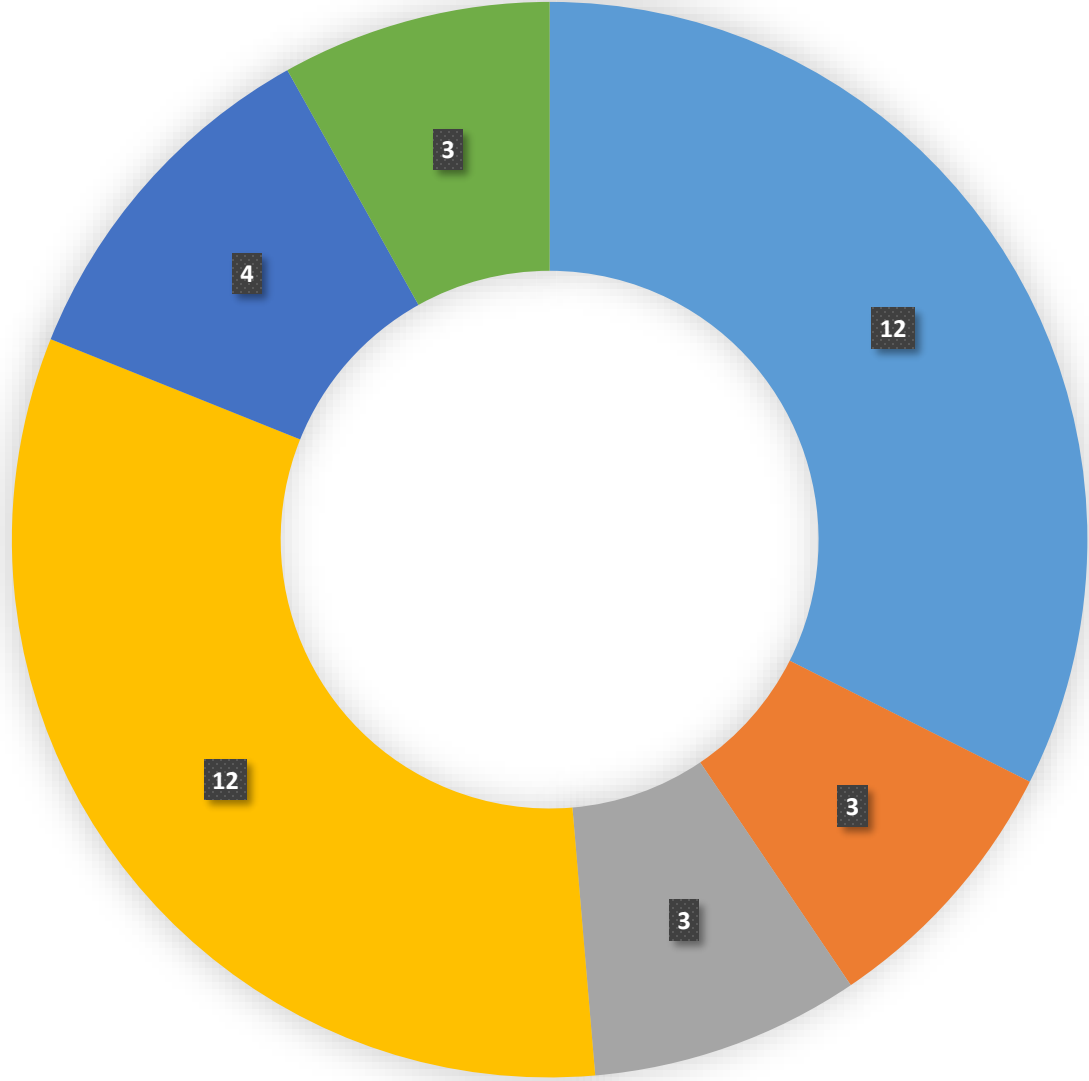


- Autónomas
- Empresa Pública
- Ente Público No Estatal
- Ministerios
- Municipalidades
- Semiautónomas

Total de 113 Trámites por tipo de Institución

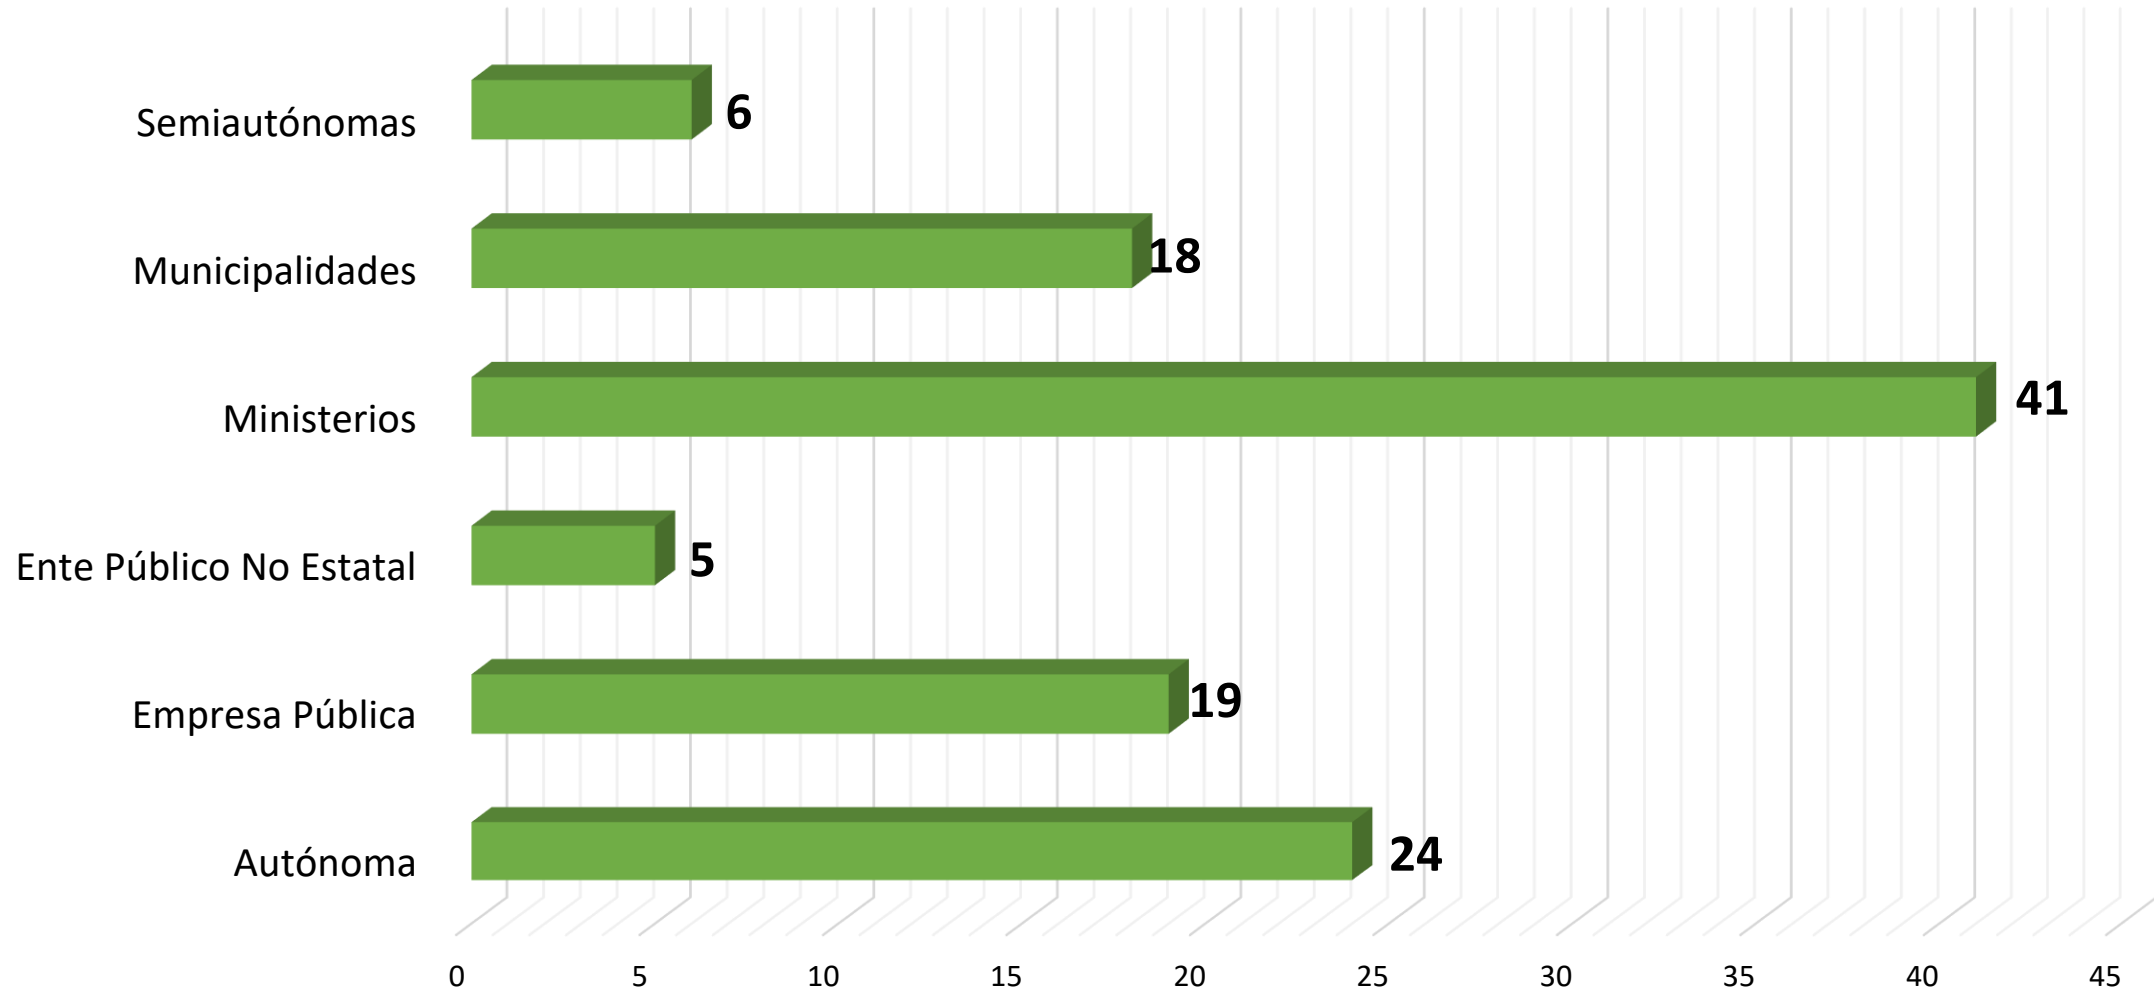

Mejoras por Implementar

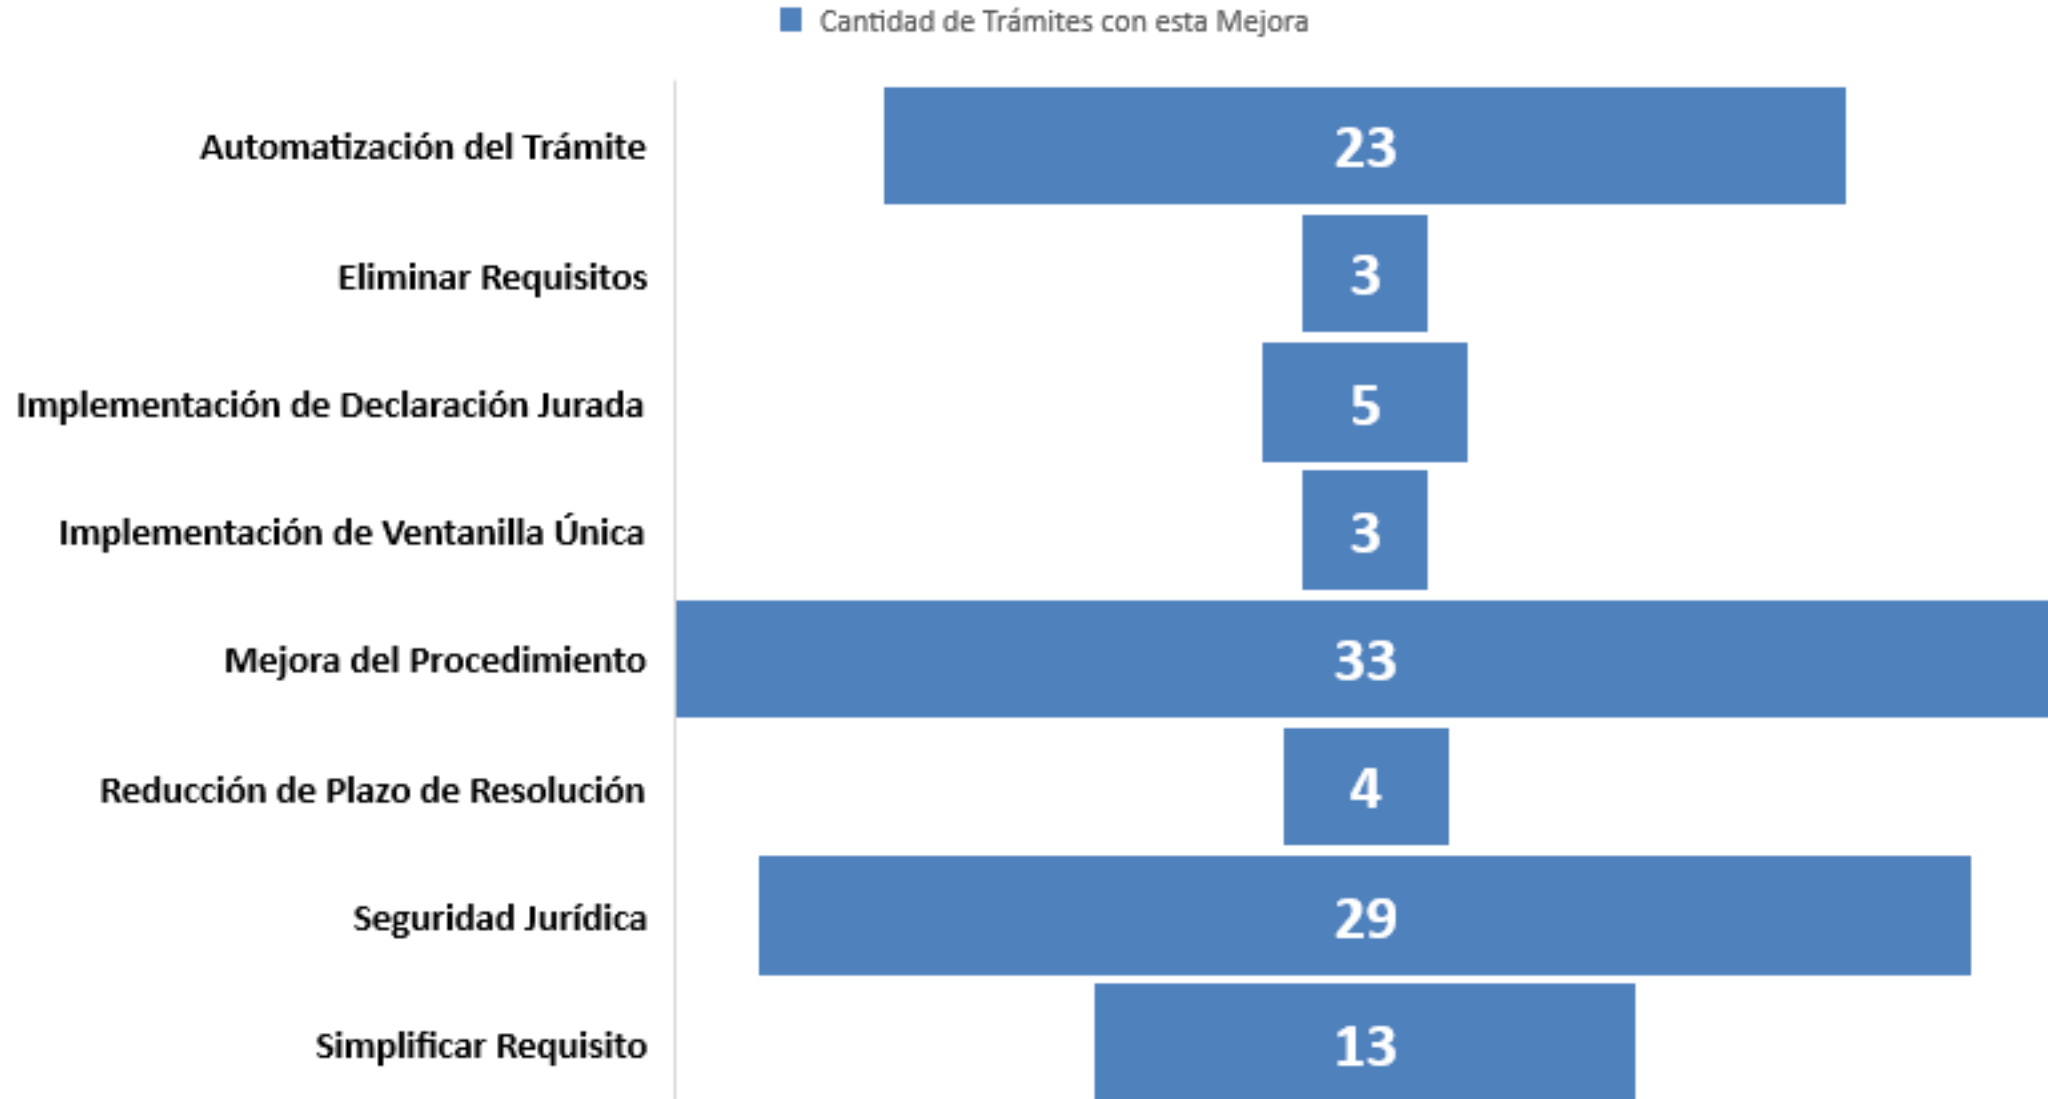

Cantidad de PMR 2020 Definitivo que presentaron II Avance en Junio 2020

N°	Institución	Porcentaje de avance del PMR	Fecha de Presentación de avance
1	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	67%	10/6/2020
2	Consejo Nacional de Producción (CNP)	29%	10/6/2020
3	Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)	35%	5/6/2020
4	Ente Costarricense de Acreditación (ECA)	41%	9/6/2020
5	Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)	83%	21/4/2020
6	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)	92%	5/6/2020
7	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	25%	10/6/2020
8	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	42%	10/6/2020
9	Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)	64%	10/6/2020
10	Ministerio de Gobernación y Policía	32%	10/6/2020
11	Ministerio de Justicia y Paz	37%	10/6/2020
12	Ministerio de la Presidencia y Presidencia de la República	100%	28/5/2020

Cantidad de PMR 2020 Definitivo que presentaron II Avance en Junio 2020

N°	Institución	Porcentaje de avance del PMR	Fecha de Presentación de avance
13	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)	30%	10/6/2020
14	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	44%	7/5/2020
15	Ministerio de Seguridad Pública (MSP)	19%	10/6/2020
16	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	52%	10/6/2020
17	Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)	34%	20/3/2020
18	Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)	63%	4/6/2020
19	Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)	50%	10/6/2020
20	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)	33%	10/6/2020
21	Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE))** Extemporáneo	67%	11/06/2020
22	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA))** Extemporáneo	100%	11/06/2020
23	Banco Central de Costa Rica (BCCR)** Extemporáneo	20%	18/6/2020
24	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)** Extemporáneo	93%	18/6/2020

PMR que cumplió con el porcentaje de 50%

N°	Institución	Porcentaje de avance del PMR	Avances Presentados por Institución	Fecha de Presentación de avance
1	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	67%	2	10/6/2020
2	Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)	83%	2	21/4/2020
3	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)	92%	2	5/6/2020
4	Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)	64%	2	10/6/2020
5	Ministerio de la Presidencia y Presidencia de la República	100%	2	28/5/2020
6	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	52%	2	10/6/2020
7	Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)	63%	2	4/6/2020
8	Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)	50%	2	10/6/2020
9	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)** Extemporáneo	93%	2	18/6/2020
10	Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE))** Extemporáneo	67%	2	11/06/2020
11	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA))** Extemporáneo	100%	2	11/06/2020

Detalle de los PMR con menos de 50%

N°	Institución	Porcentaje de avance del PMR	Avances Presentados por Institución	Fecha de Presentación de avance
1	Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)	35%	2	5/6/2020
2	Consejo Nacional de Producción (CNP)	29%	2	10/6/2020
3	Ente Costarricense de Acreditación (ECA)	41%	2	9/6/2020
4	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	25%	2	10/6/2020
5	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	42%	2	10/6/2020
6	Ministerio de Gobernación y Policía	32%	2	10/6/2020
7	Ministerio de Justicia y Paz	37%	2	10/6/2020
8	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)	30%	2	10/6/2020
9	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	44%	2	7/5/2020
10	Ministerio de Seguridad Pública (MSP)	19%	2	10/6/2020
11	Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)	34%	2	20/3/2020
12	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)	33%	2	10/6/2020
13	Banco Central de Costa Rica (BCCR)** Extemporáneo	20%	2	18/6/2020

Detalle de los PMR con 0% de Avance

N°	Institución	Tipo de institución	Estado del flujo	# trámites en PMR	Porcentaje de avance del PMR	Avances Presentados por Institución
1	Editorial Costa Rica (ECR)	Empresa Pública	PMR definitivo publicado	1	0	0
2	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)	Semiautónoma	PMR definitivo publicado	3	0	0
3	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)	Autónoma	PMR definitivo publicado	1	0	0
4	Municipalidad de Desamparados	Municipalidad	PMR definitivo publicado	2	0	0
5	Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE)	Empresa Pública	Avance reportado	1	0	0

Detalle de los PMR que se quedaron con el I de Avance

N°	Institución	Estado del flujo	Porcentaje de avance del PMR	Avances Presentados por Institución	Fecha de Presentación de avance
1	Instituto de Desarrollo Rural (INDER)	PMR definitivo publicado	43%	1	1/6/2020
2	Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE)	Revisión interna del avance	48%	1	9/6/2020
3	Junta de Protección Social (JPS)	PMR definitivo publicado	45%	1	4/3/2020
4	Ministerio de Educación Pública (MEP)	Revisión interna del avance	11%	1	13/5/2020
5	Ministerio de Hacienda (MH)	PMR definitivo publicado	26%	1	11/12/2019
6	Municipalidad de Cartago	PMR definitivo publicado	15%	1	10/12/2019
7	Municipalidad de Heredia	PMR definitivo publicado	18%	1	10/3/2020
8	Municipalidad de San José	Avance reportado	63%	1	11/6/2020

Muchas gracias

Junio 2020

Para más información

Infotramites@meic.go.cr

